



Riverdale/New Carrollton

Reunión #10 del Equipo Comunitario Asesor - CAT
23 de febrero 2023

CONOZCA AL EQUIPO DEL PROYECTO TEAM



Matthew Pollack PE, PMP

Director Ejecutivo

Ray Biggs, II

Director de Proyecto

Gary Witherspoon

Director Adjunto de Proyecto - Alcance Público

Tim Stevens

Gerente de construcción

Carla Julian

Gerente de partes interesadas

RESUMEN DE LA REUNIÓN


- Presentaciones del personal
- Actualización del proyecto
- Descripción general de la construcción
- Progreso Fotos
- preguntas y respuestas



- Fomente el intercambio de información bidireccional entre el proyecto y las comunidades y participe en un diálogo abierto con los líderes del proyecto.
- Sirva como enlace compartiendo información entre su comunidad, las organizaciones locales y el equipo del proyecto.
- Póngase en contacto con nuestro personal para obtener información sobre el proyecto con la frecuencia necesaria fuera de las reuniones del equipo.



ESTRUCTURA ORGANIZATIVA DEL PROYECTO

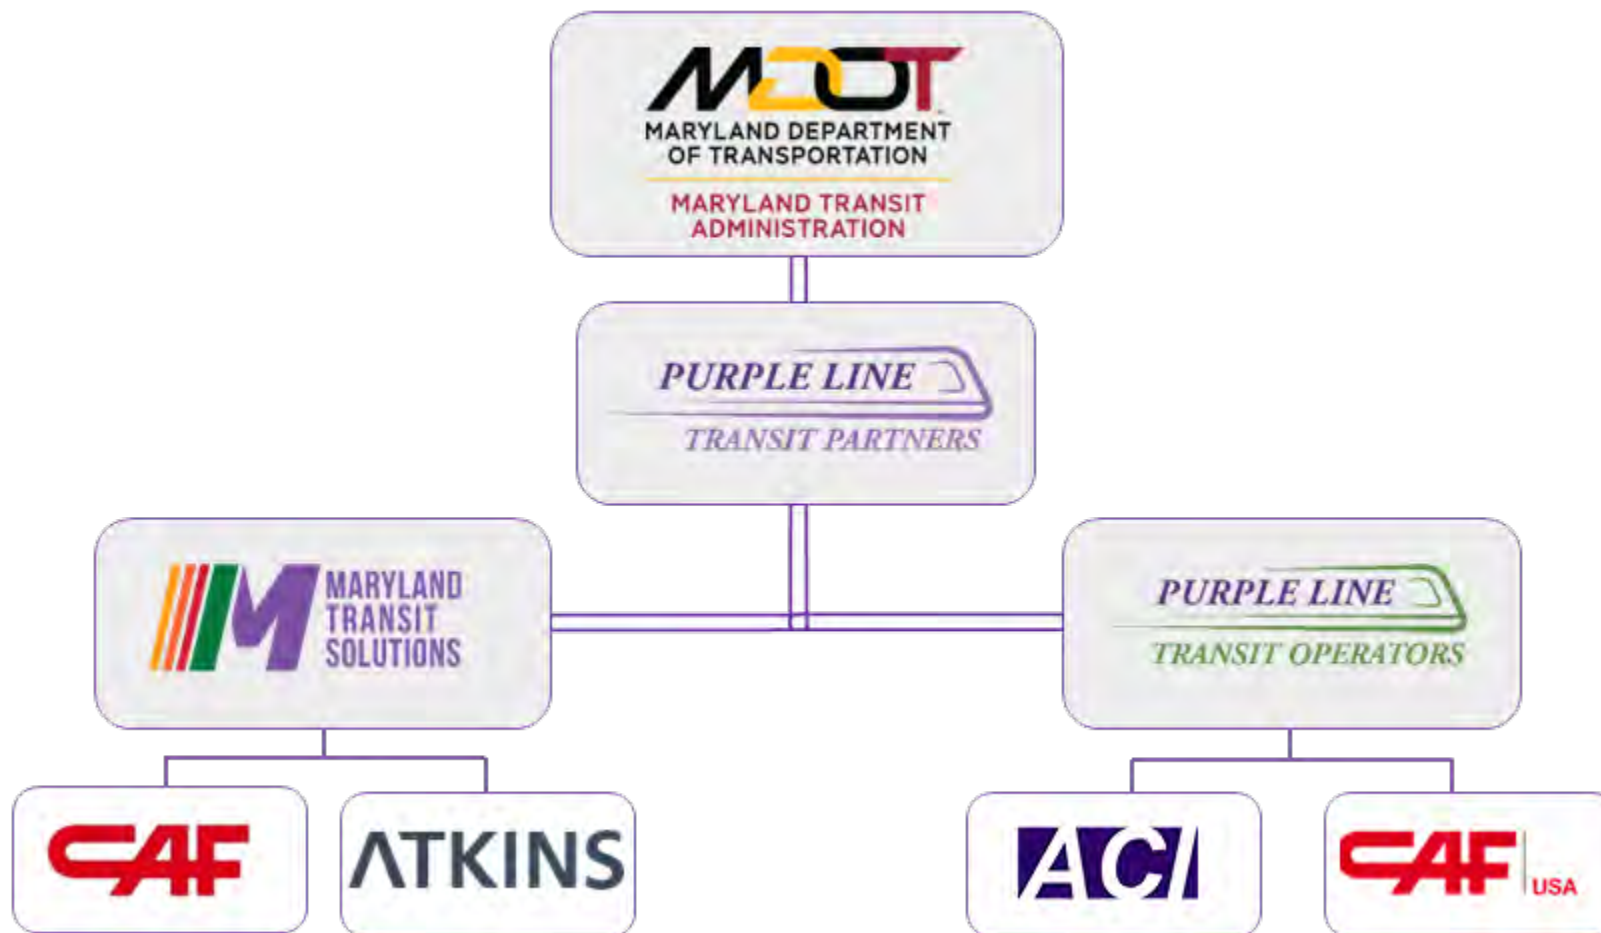

CRONOGRAMA DEL PROYECTO




*Horario bajo revisión

ESTACIONES DE RIVERDALE/NEW CARROLLTON



- Riverdale Park North-UMD
- Riverdale Park-Kenilworth
- Beacon Heights-East Pines
- Glenridge
- New Carrollton


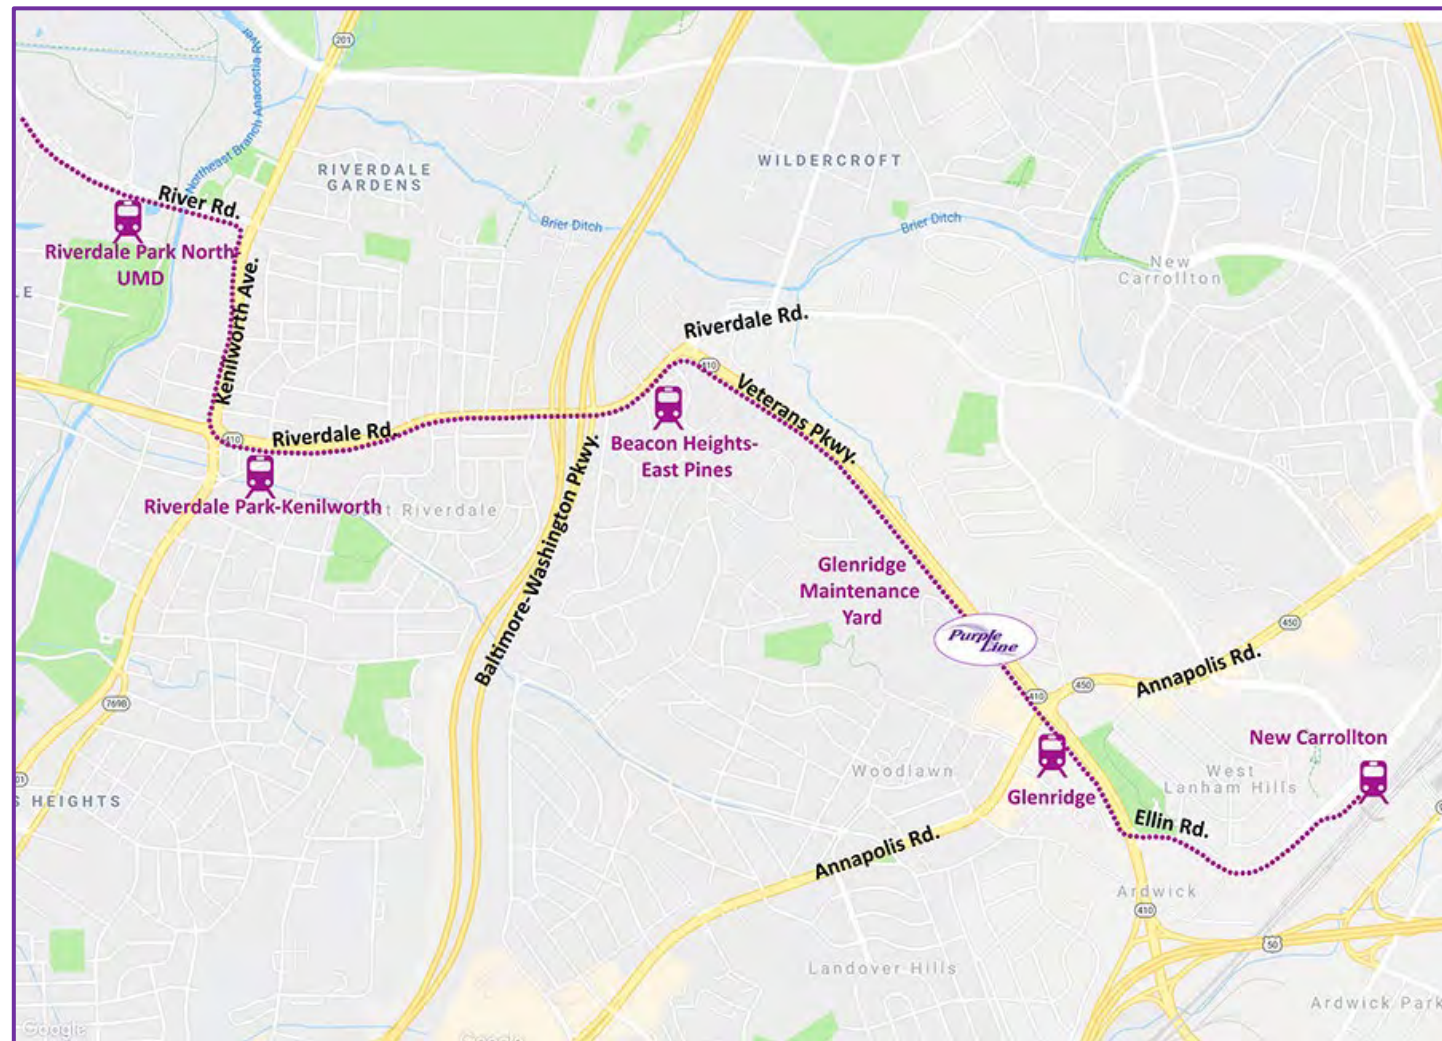


REPRESENTACIÓN TÍPICA DE LA PLATAFORMA LATERAL

*Purple
Line*




PLANO DE LA ESTACIÓN RIVERDALE PARK NORTH – UMD

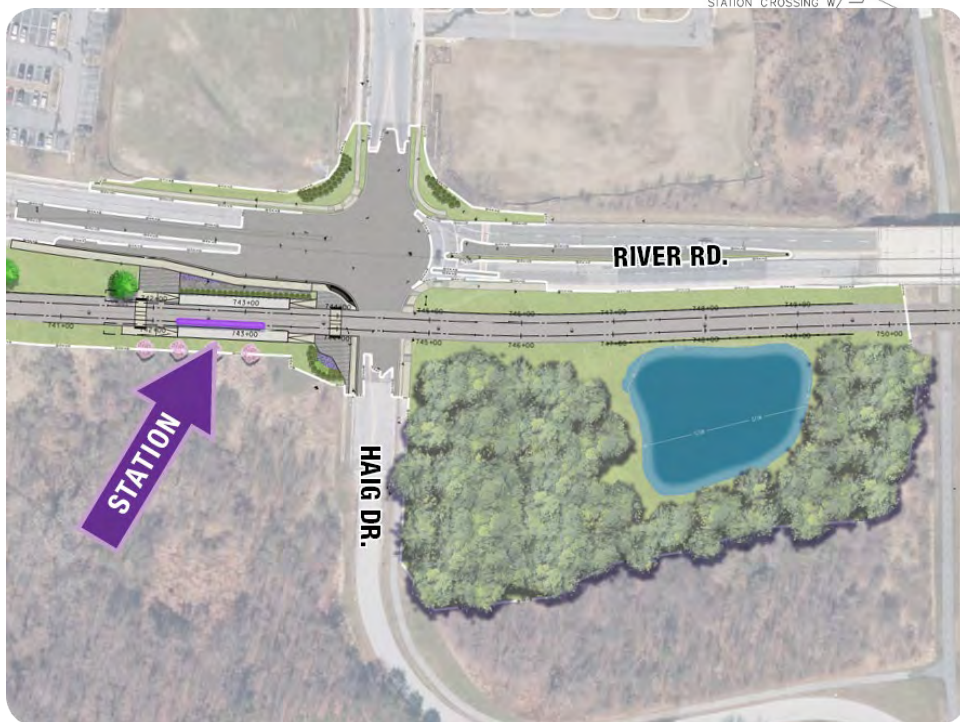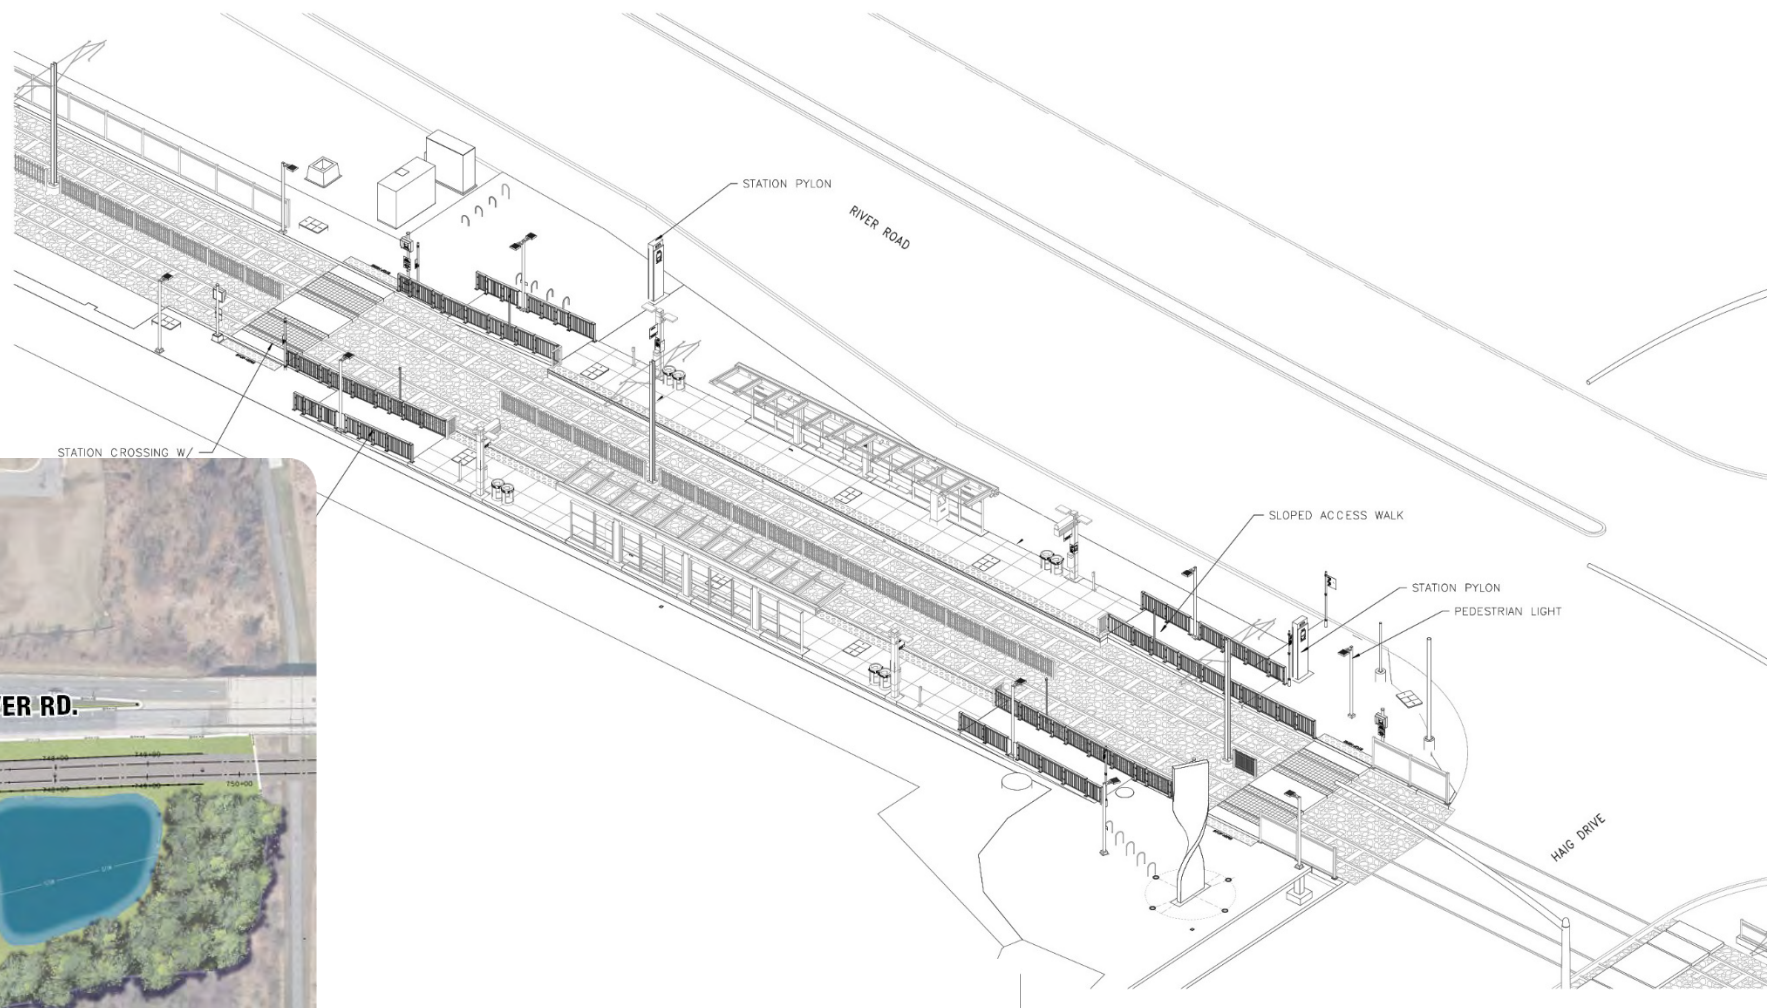

RENDERIZACIÓN DE LA ESTACIÓN RIVERDALE PARK – KENILWORTH




PLANO DE LA ESTACIÓN RIVERDALE PARK – KENILWORTH

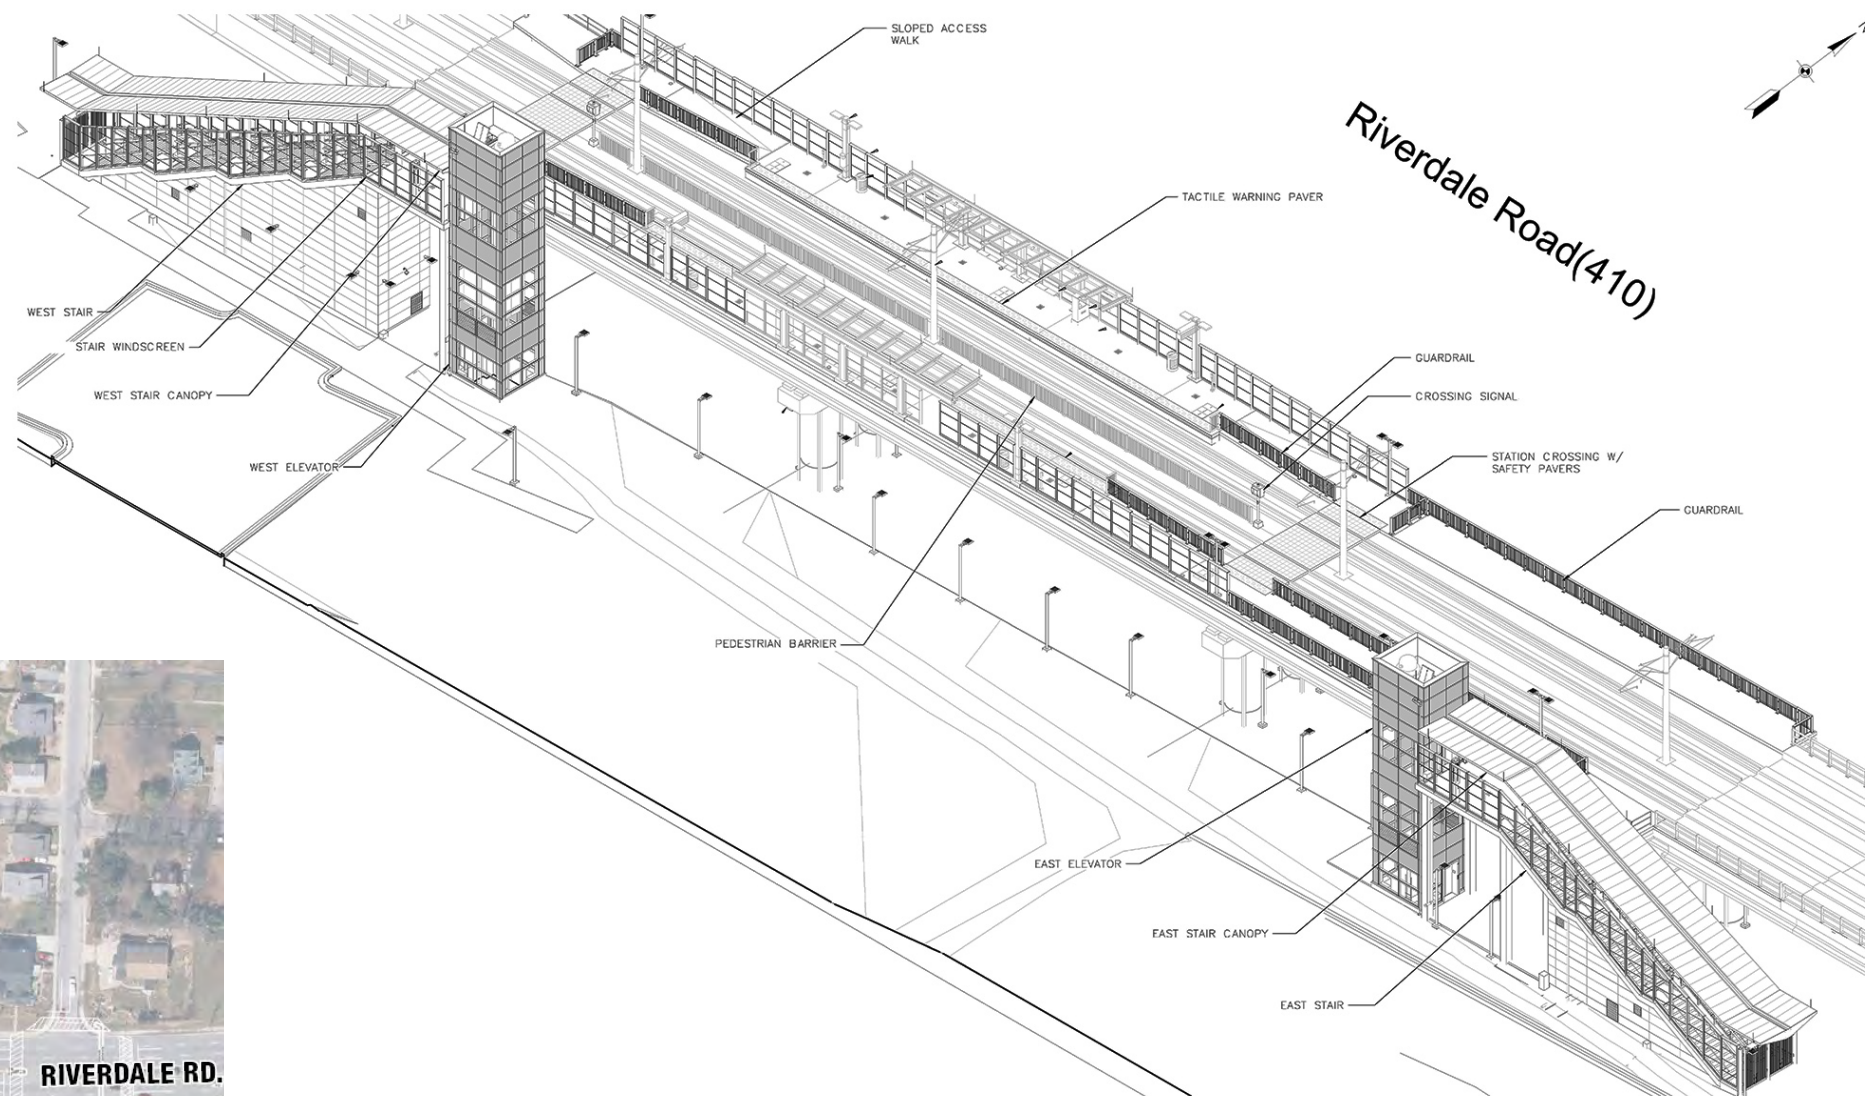


REPRESENTACIÓN TÍPICA DE LA PLATAFORMA CENTRAL



*Purple
Line*

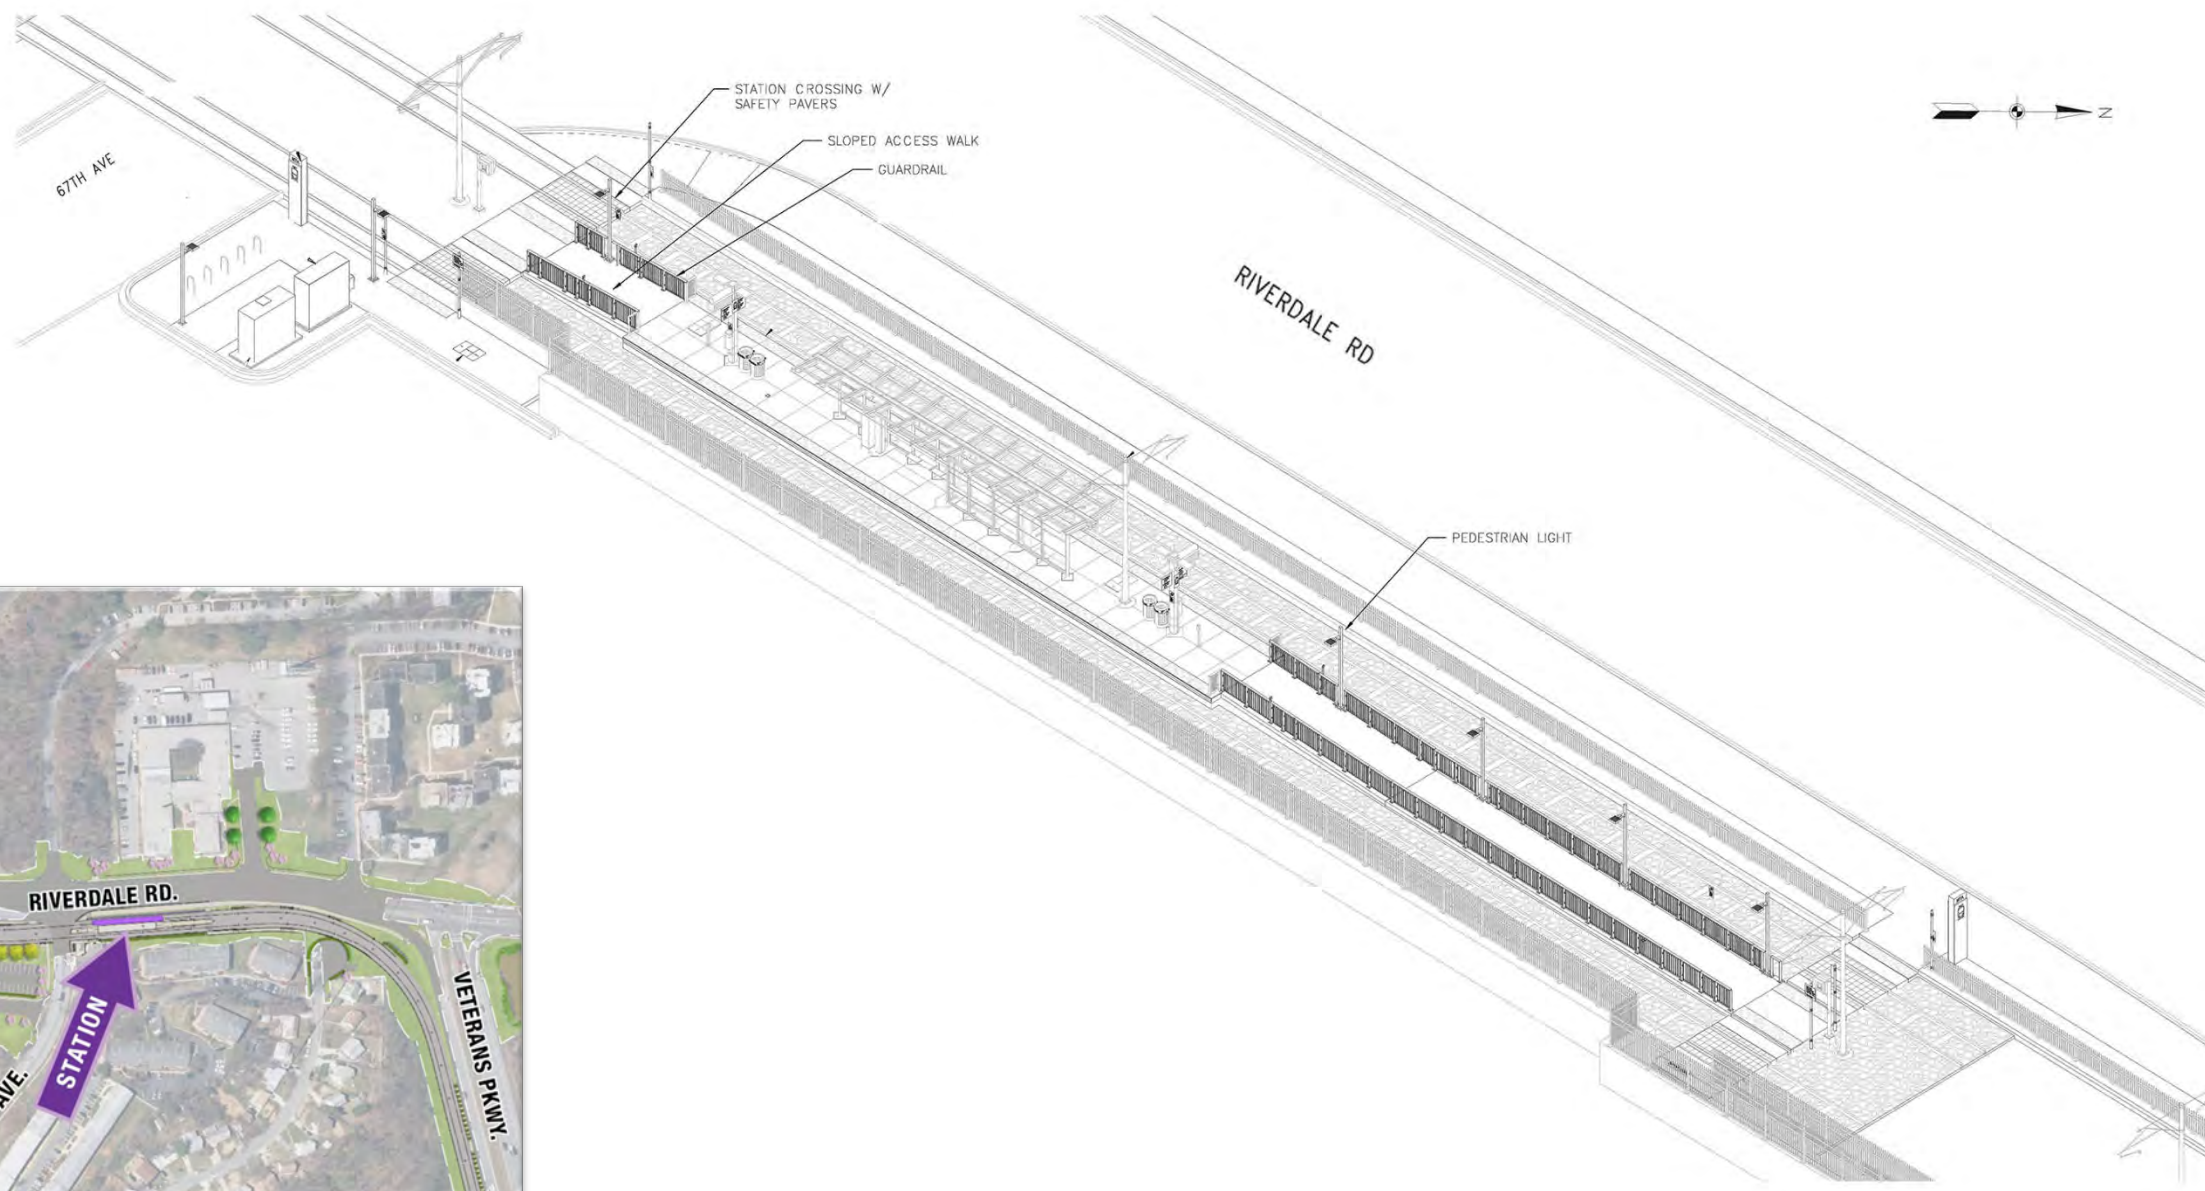


PLANO DE LA ESTACIÓN GLENRIDGE

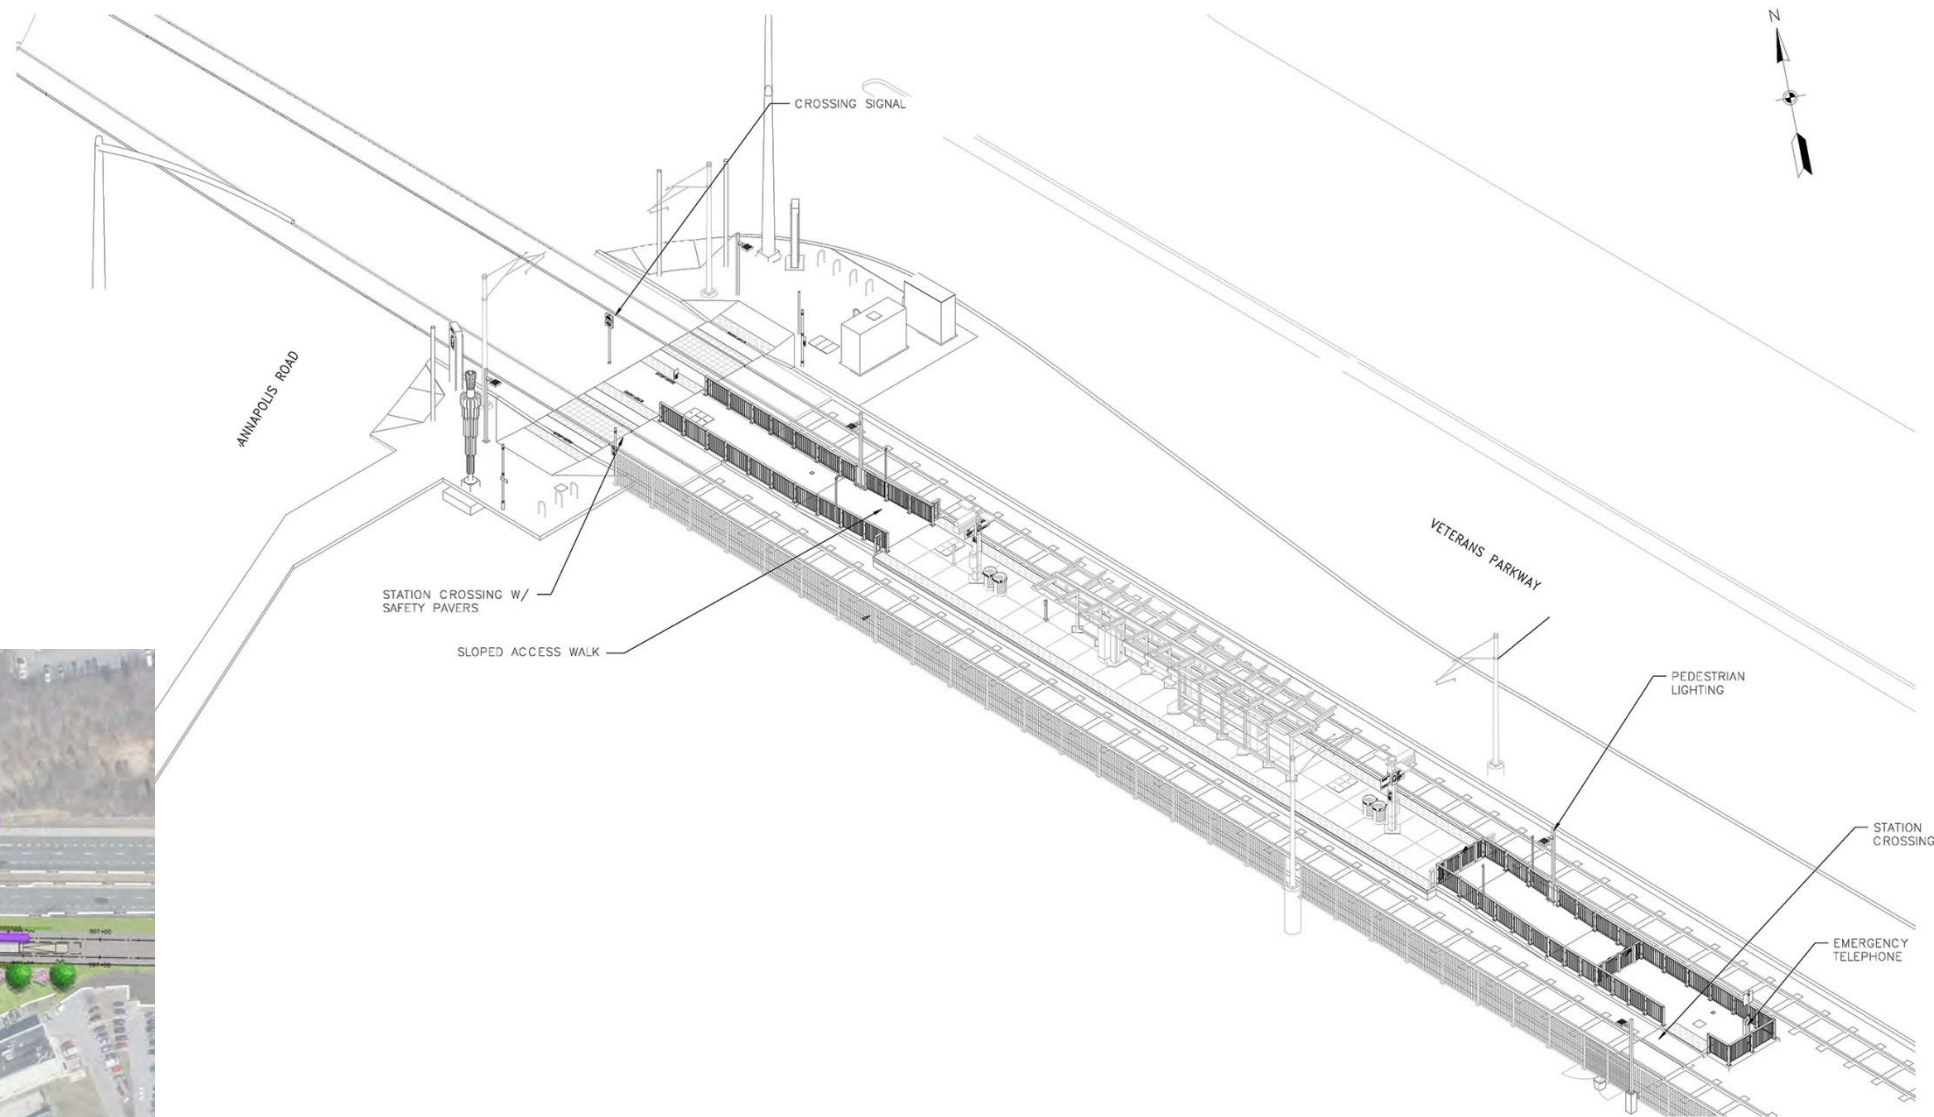

REPRESENTACIÓN DE LA ESTACIÓN NEW CARROLLTON



PLANO DE LA ESTACIÓN NEW CARROLLTON

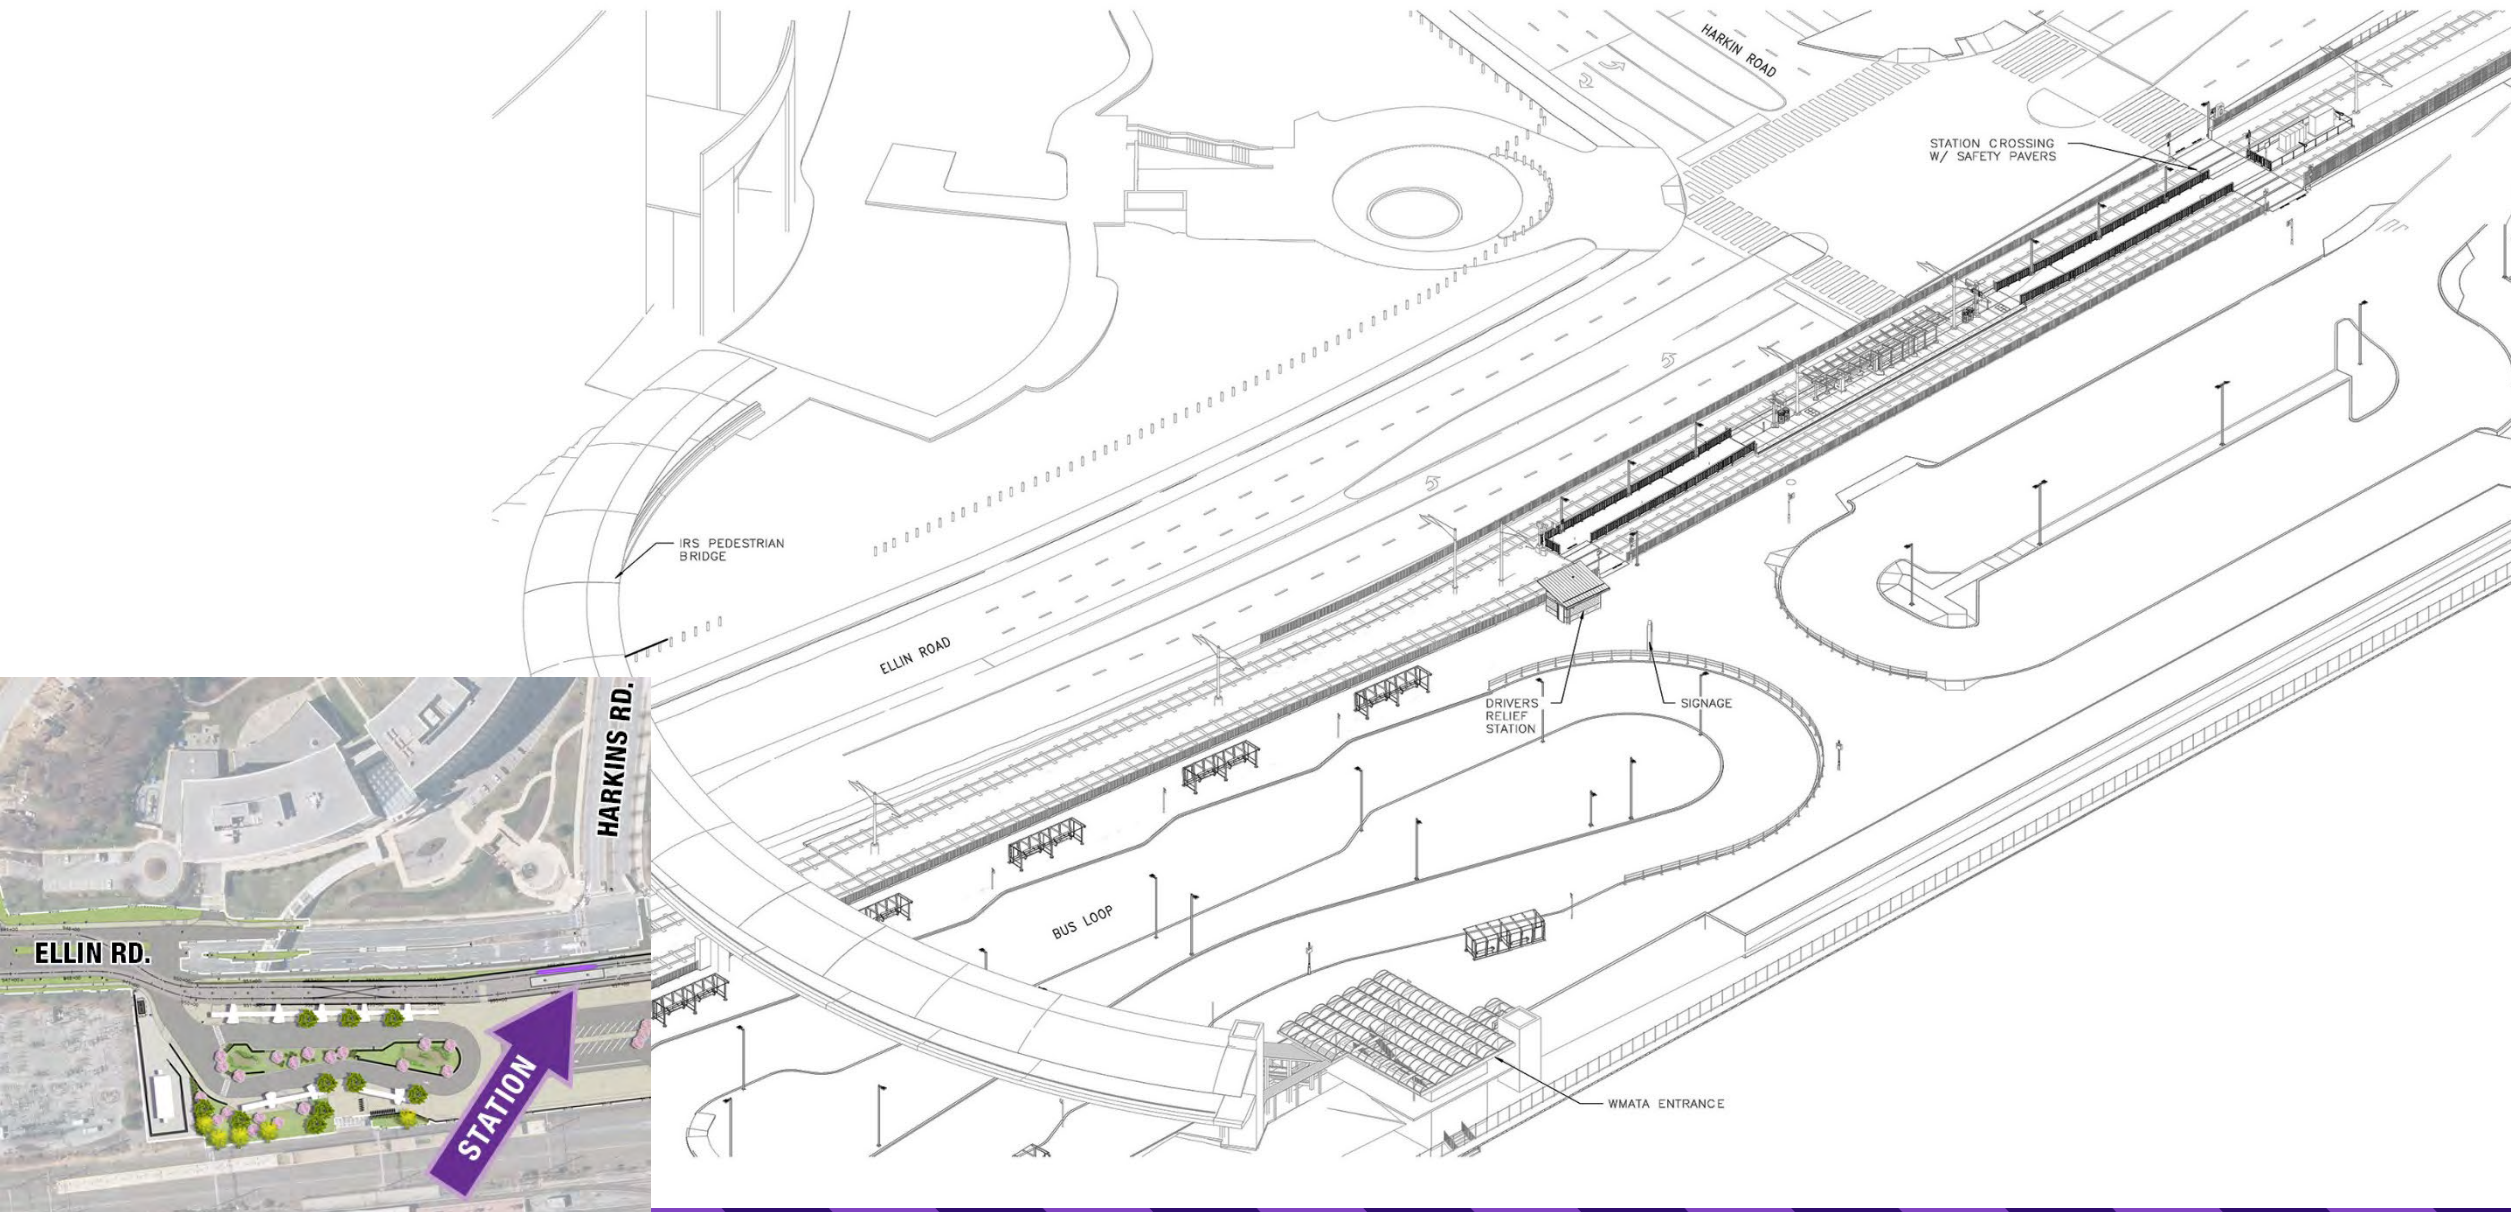

LOGROS DEL PROYECTO

- El trabajo avanzó en cinco puentes, incluido el trabajo en la estación aérea en Riverdale Park-Kenilworth.
- Abrió el circuito de autobús reconfigurado en la estación College Park-UMD.
- Comenzó la construcción de cuatro estaciones: Glenridge, Riverdale Park North-UMD, Silver Spring Library y Silver Spring.
- Abrió el paso subterráneo de Sleaford en Chevy Chase.
- Producción completada de 26 de 28 vehículos ferroviarios ligeros.



Kenilworth Avenue a Riverdale Road

Trabajo reciente y en curso:

Reubicaciones completas de agua, alcantarillado, gas y telecomunicaciones.

- Comenzó la inspección y los preparativos para la instalación del drenaje pluvial.

Próximos trabajos:

Implementar el cambio de tráfico de River Road a Riverdale Road para establecer una nueva zona de trabajo.

- Comenzar la instalación del sistema de drenaje pluvial.
- Comenzar la construcción de muelles y estribos para el puente elevado en Kenilworth Avenue hasta Riverdale Road.
- Comience la construcción del muro de apoyo.



Riverdale Park-Kenilworth Station

Trabajo reciente y en curso:

Instalación de medidas de seguridad que incluyen protección contra caídas y voladizos (en la foto).

- Inspeccione las vigas existentes.
- Muros completos y relleno de acceso.

Próximos trabajos:

Comenzar la construcción de la plataforma de la estación con formas, barras de refuerzo y hormigón.

- Instalar cimientos para ascensores y estructuras circundantes.



ACTUALIZACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN: RIVERDALE/NEW CARROLLTON

Riverdale Road a Veterans Parkway

Trabajo reciente y en curso:

- Continuar con las reubicaciones de servicios públicos de agua y alcantarillado.
- Comenzó el trabajo de preparación del sitio a lo largo de Mustang Drive hasta Eastpine Drive.
- Comenzó la instalación de drenaje pluvial.
- Comenzó las instalaciones de cimentación del Sistema Catenario Aéreo (OCS).

Próximos trabajos:

- Implementar un nuevo patrón de tráfico para la ampliación de Riverdale Road entre Baltimore-Washington Parkway y Veterans Parkway.
- Completar la mampostería del puente Baltimore-Washington Parkway.
- Comenzar mejoras adyacentes a las rampas de Baltimore-Washington Parkway.
- Comenzar a trabajar en la estación Beacon Heights-East Pines.



Veterans Parkway

Trabajo reciente y en curso:

- Se completó la reubicación de la línea de agua de la Comisión Sanitaria Suburbana de Washington de 66".
- Comenzó el trabajo de cimentación de la subestación de energía de tracción (TPSS) adyacente a Veterans Parkway.

Próximos trabajos:

- Implementar un cambio de tráfico en Veterans Parkway cerca de Ellin Road para establecer una zona de trabajo para comenzar la instalación de vías empotradas en Veterans Parkway.
- El tráfico se desviará hacia el lado sur de Veterans Parkway durante aproximadamente ¼ de milla.



Instalación de operaciones y mantenimiento de Glenridge(OMF)

Trabajo reciente y en curso:

- Nivelación y drenaje continuos del sitio.
- Se completó la construcción de la instalación de gestión de aguas pluviales.
- Se completaron 113 instalaciones de cimientos para los postes del sistema de catenaria aérea (OCS).

Próximos trabajos:

- Continuar el trabajo dentro de la estructura OMF.
- Comenzar la instalación de vías para el patio de vías.



Centro commercial de Glenridge

Trabajo reciente y en curso:

- Se instalaron pilares de concreto para el puente que transportará automóviles sobre la alineación del tren ligero desde Veterans Parkway hasta el centro comercial Glenridge.

Próximos trabajos:

- Vierta la cubierta del puente de hormigón.
- Pavimentar las rampas de acceso al puente.



Estación de Glenridge

Trabajo reciente y en curso:

- Levantamiento completo y preparación para la construcción de la estación.
- Vaciado de la base de la estación completada.

Próximos trabajos:

- Comience la instalación de los servicios públicos de la estación.
- Comenzar la construcción de la estructura de la estación.



Ellin Road

Trabajo reciente y en curso:

- Continuación de la instalación de drenaje pluvial entre Hanson Oaks y 78th Avenue.
- Comenzó la preparación del sitio para la ubicación de TPSS adyacente a Ellin Road.
- Comenzó la instalación de rieles empotrados.

Próximos trabajos:


- Implementar el cambio de tráfico entre Hanson Oaks y Harkins Road: se mantendrá un carril en cada dirección.
- Comience la instalación de la base OCS.
- Continúe la colocación de la pista.



Estación de New Carrollton

Próximos trabajos:

- Comenzar la construcción de un nuevo estacionamiento para el personal de WMATA cerca de la estación.
- Comenzar la construcción de la estación de el Purple Line.

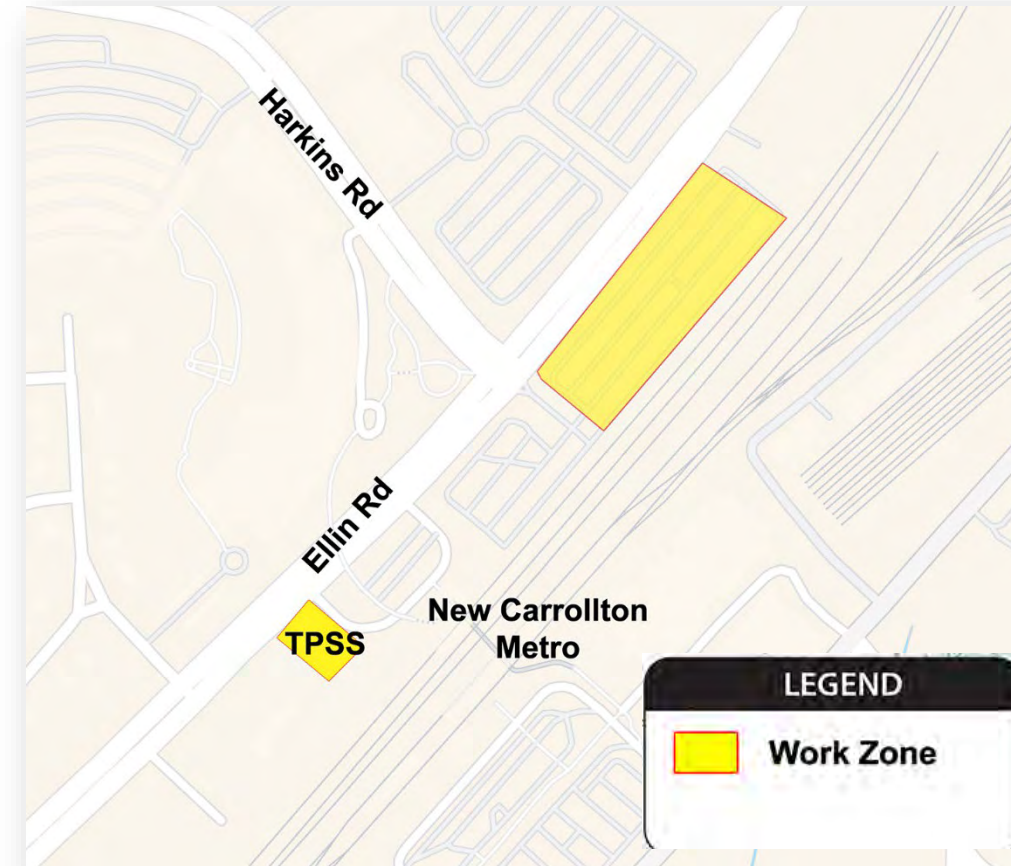

- Provide briefings for community and business groups.
- Manage stakeholder hotline (email/phone).
- Meet regularly with impacted businesses.
- Produce project newsletter and social media.
- Distribute construction notifications.
- Host Community Advisory Team (CAT) meetings.



MANTENIMIENTO DEL TRÁFICO: QUÉ ESPERAR

- Los patrones de tráfico existentes cambiarán a medida que se realice el trabajo, según sea necesario.
- El trabajo puede ocurrir en ambos lados de la carretera ya través de las carreteras.
- Cuando se requiera el cierre de un carril, se distribuirá un aviso por mensaje de texto y correo electrónico.
- Se colocarán conos y barriles naranjas (barricadas temporales).
- El abanderado, cuando sea necesario, dirigirá el tráfico.
- El trabajo subterráneo de servicios públicos puede requerir placas de carretera temporales.



Regístrese para actualizaciones de construcción en:

purplelinemd.com

Envíenos un correo electrónico:

outreach@purplelinemd.com

Llámenos:

443-451-3706/ 443-451-3705 (Español)

Síguenos:

[@purplelinemd](https://www.instagram.com/purplelinemd)



¿PREGUNTAS?



MUCHAS GRACIAS
